

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE OBRA

Relatório: Nº 025

Mês: AGOSTO/2017

INCORPORAÇÃO:



ENDEREÇO:

Rua Batista de Oliveira, 1023
Cocó - Fortaleza - Ceará

ENGENHEIRO RESIDENTE:

Roberto Oliveira

DATA DE INÍCIO:


jun/15

DATA DE CONCLUSÃO:

mai/18

EVOLUÇÃO DA OBRA

54,01%

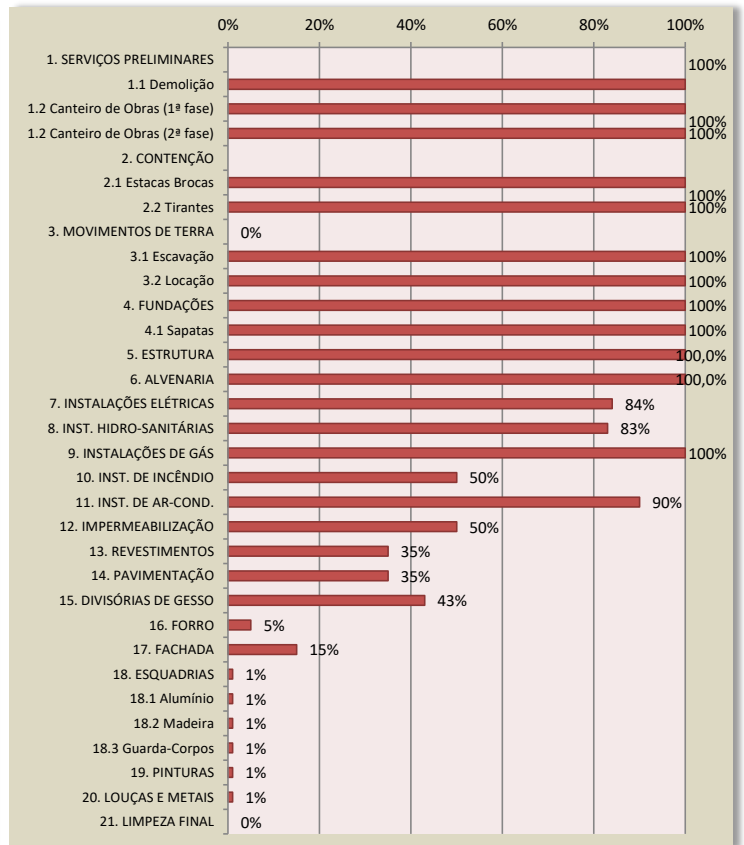

Principais Atividades Executadas no Período:

INÍCIO DO REBOCO DE FACHADA;
INSTALAÇÕES DAS PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO DOS APTS 602, 801 E 902;
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO SUBSOLO 2 e PARTE DOS PAVIMENTOS TIPOS;
PRUMADAS HIDRÁULICAS, ELÉTRICA E INCÊNDIO (SHAFT HALL DE SERVIÇO);
CONCLUSÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO (LAJES DE PERIFERIA);
INSTALAÇÕES ISOMÉTRICAS DO 18° AO 21° TIPO;
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (RAMAIS) 1° E 21° TIPO;
REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO DO PORCELANATO E CERÂMICA DO 10° AO 14° TIPO;
REVESTIMENTO DE GESSO DO 11° AO 14° TIPO;
DIVISÓRIAS DE GESSO DOS APTS 602,801 E 902;
CIMENTADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 17° AO 21° TIPO;
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS APARTAMENTOS 16° AO 20° TIPO.

