

## RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE OBRA

Relatório: Nº 030

Mês: **DEZEMBRO /2017, JANEIRO E FEV./2018**

### INCORPORAÇÃO:



### ENDEREÇO:

Rua Batista de Oliveira, 1023  
Cocó - Fortaleza - Ceará

### ENGENHEIRO RESIDENTE:

Roberto Oliveira

### DATA DE INÍCIO:


jun/15

### DATA DE CONCLUSÃO:

jun/18

## EVOLUÇÃO DA OBRA

**80,92%**

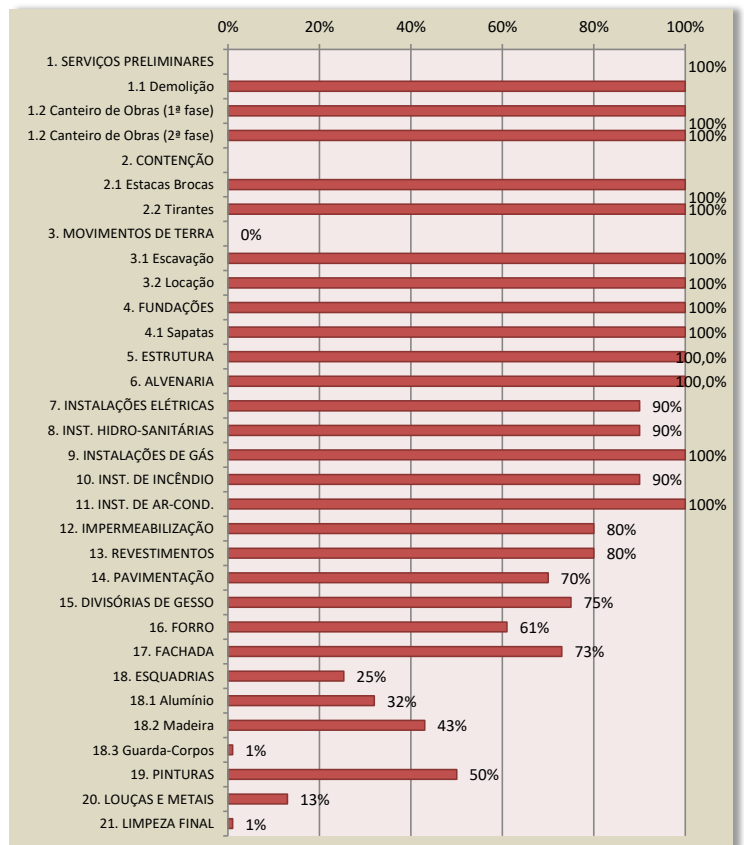

### Principais Ativid. Execut. no Período: DEZ.17, JAN E FEV.18

REBOCO E ASSENTAMENTO CERÂMICO DAS FACHADAS: LESTE, SUL, NORTE E 1a e 2a. PARTE DA OESTE  
PAREDES DIVISÓRIAS DE GESSO DO 18o., 19o., 20o. tipo e APT 1001, 701, 501  
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO POLIDO DOS SUBSOLO 01;  
REBOCO DE ALVENARIAS DOS SUBSOLOS 01, 02 e 03;  
FORRO DE GESSO DOS PAVIMENTOS TIPO: DO 20o. AO 14o. TIPO;  
TUBULAÇÃO E FIAÇÃO ELÉTRICA: DO 20o. AO 17o. TIPO;  
REVESTIMENTO PORCELANATO E CERÂMICO : 1º TIPO;  
REVESTIMENTO DE GESSO: HALL DE SERVIÇO 20o. AO 5o. TIPO;  
INTALAÇÕES DAS AREAS COMUNS DO TERREO (POSTE DEFINITIVO);  
COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS: 20 AO 14o. TIPO (EXCETO O 1502 E 1602)  
CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE SERVIÇO;  
PREPARAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR SOCIAL;  
PISO DOS HALLS DE SERVIÇO: 20o AO 18o TIPO;  
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERREO;  
CIMENTADO DO TERREO;  
ALVENARIA DO MEZANINO;  
INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA: 20o AO 11o TIPO  
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS: 20o e 19o  
REJUNTE E LIMPEZA DAS FACHADAS: LESTE, SUL, NORTE E 1a PARTE DA OESTE

