

CONSTRUÇÃO:

TRATO.
INCORPORAÇÕES



ENDEREÇO:

Rua Carolina Sucupira, 821
Aldeota - Fortaleza - Ceará

ENGENHEIRO RESIDENTE:

Renê Pinheiro

DATA DE INÍCIO:

mai/15

DATA DE CONCLUSÃO:


set/18

EVOLUÇÃO TOTAL

69,90%



Evolução da Obra

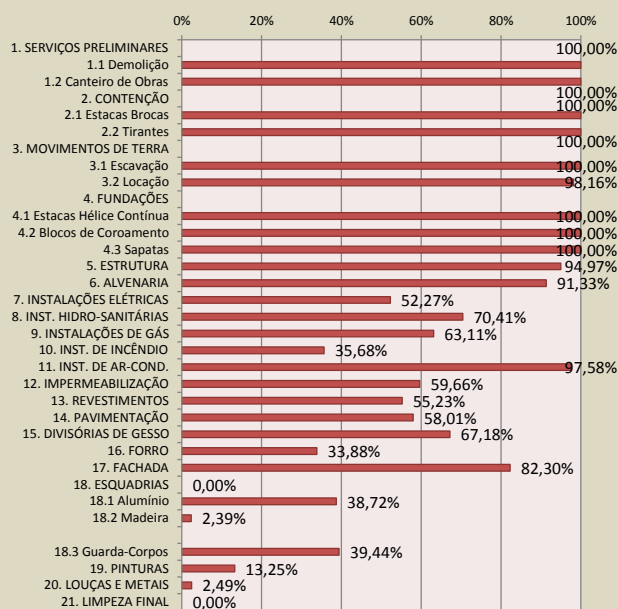

Principais Atividades Executadas no Período:

- *Serviço de Estrutura - Lajes treliçadas do Deck;
- *Instalação de Tubulação para Drenagem de Jardim - Pilotis;
- *Instalações Hidráulicas - Pilotis (Deck, Piscina Infantil e Passeios);
- *Instalações Elétricas (Tub. de Paredes de Divisórias de Gesso, Fiação Geral do Apartamento e Fechamento do Quadro de Distribuição) - Apt 1302 (100%), 1401 (100%) e 1701 (100%);
- *Divisórias de Gesso - Apts. 402, 201 e 302;
- *Emassamento de divisórias de Gesso - Apts. 1802 e 501;
- *Revestimento em Porcelanato - Apts. 402 (100%), 102 (100%) e 101 (100%);
- *Forro de gesso - Apts. 1202 e 1301;
- *Assentamento de bancadas - Apts. 1601 (100%), 1702 (50%) e 1302 (100%);
- *Pintura (1a Demão) - Apts. 801 (100%), 802 (100%), 901 (100%), 902 (100%), 1001 (100%), 1002 (100%) e 1101 (100%);
- *Esquadrias de Alumínio - Apts. 1201 (100%), 1202 (100%), 1301 (100%) e 1601 (100%);
- *Regularização de piso - Pilotis;
- *Revestimento Externo - Caixa d'água / Laje de segurança / Detalhes de Fachada;
- *Rejuntamento de Fachada - Fachadas Norte, Sul e Oeste;
- *Impermeabilização com manta asfáltica na região do Deck e Piscina Infantil;
- *Rejuntamento Interno e Proteção de Piso - Apts. 101 (100%), 102 (100%), 202 (100%), 302 (100%) e 1802 (100%);
- *Instalação de Elevadores - Elevador de serviço;
- *Remoção de Materiais do SS3;

Fotos Atuais:

